COMUNE DI SQUINZANO
Provincia di Lecce

FINANZIAMENTO DUC - PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE DI "PIAZZA SANT'ANNA"

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Allegato:

Cronoprogramma

Allegato n :

10

Committente :

Comune di Squinzano (LE)

Data:

Luglio 2023

R.U.P :

Ing. Michele ZACCARIA

Progettista :

Ing. Roberto MARZO

Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	Area	N. squadre	Comp. squadre	Tot. lav.	Prod. g. sq
Diagramma di Gantt	65/92	04/09/2023	04/12/2023					
Allestimento cantiere	2/2	04/09/2023	05/09/2023					
Accessi agli scavi e circolazione mezzi	2/2	04/09/2023	05/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Accessi e circolazione mezzi in cantiere	2/2	04/09/2023	05/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Accessi e circolazione pedonale in cantiere	2/2	04/09/2023	05/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Installazione ed uso gru a torre su binari	2/2	04/09/2023	05/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Servizi igienici di cantiere	2/2	04/09/2023	05/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Delimitazione dell'area con elementi in ferro	2/2	04/09/2023	05/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Impianto elettrico di cantiere	2/2	04/09/2023	05/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Preparazione area di stoccaggio materiali di risulta	2/2	04/09/2023	05/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Rimozione lastre di pietra	3/3	06/09/2023	08/09/2023	Intero cantiere	1	3	3	40
Demolizione di pavimenti esterni	8/8	11/09/2023	20/09/2023	Intero cantiere	1	3	3	130
Abbattimento di alberi	4/4	21/09/2023	26/09/2023	Intero cantiere	1	3	3	0
Scarifica di strati in conglomerato bituminoso	1/1	26/09/2023	26/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Scarificazione di massicciata stradale	1/1	26/09/2023	26/09/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzo	14/14	26/09/2023	13/10/2023	Intero cantiere	1	4	4	45
Trasporto e smaltimento materiali da scavi o sbancamenti	1/1	13/10/2023	13/10/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Trasporto e smaltimento materiali da scarifica	1/1	13/10/2023	13/10/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Formazione di strati di fondazione in misto granulare	1/1	13/10/2023	13/10/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Fondazioni in cls	3/3	13/10/2023	17/10/2023	Intero cantiere	1	5	5	3
Impianto elettrico e di terra esterno agli edifici	6/6	18/10/2023	25/10/2023	Intero cantiere	1	2	2	60
Installazione di gru a torre automontante	1/1	24/11/2023	24/11/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Pavimenti in elementi autobloccanti	11/11	24/10/2023	08/11/2023	Intero cantiere	1	3	3	40
Pulizia di basoli con acqua a pressione	8/8	09/11/2023	20/11/2023	Intero cantiere	1	3	3	250
Installazione apparecchiature elettriche	1/1	21/11/2023	21/11/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Esecuzione rilevato stradale con mezzi meccanici	1/1	21/11/2023	21/11/2023	Intero cantiere	1	3	3	300
Compattazione meccanica del terreno	1/1	21/11/2023	21/11/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Conglomerato bituminoso per strato di usura	1/1	22/11/2023	22/11/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Binder di collegamento con bitume liquido	1/1	22/11/2023	22/11/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Posa in opera di arredi e simili	2/2	23/11/2023	24/11/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Messa a dimora di specie arboree/ Messa a dimore di specie arboree	4/4	27/11/2023	30/11/2023	Intero cantiere	1	3	3	0
Giochi	2/2	24/11/2023	27/11/2023	Intero cantiere	1	3	3	0
Smobilizzo cantiere	2/4	01/12/2023	04/12/2023					
Accessi agli scavi e circolazione mezzi	2/2	01/12/2023	04/12/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Accessi e circolazione mezzi in cantiere	2/2	01/12/2023	04/12/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Accessi e circolazione pedonale in cantiere	2/2	01/12/2023	04/12/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Installazione ed uso gru a torre su binari	2/2	01/12/2023	04/12/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Servizi igienici di cantiere	2/2	01/12/2023	04/12/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Delimitazione dell'area con elementi in ferro	2/2	01/12/2023	04/12/2023	Intero cantiere	1	0	0	0
Impianto elettrico di cantiere	2/2	01/12/2023	04/12/2023	Intero cantiere	1	0	0	0

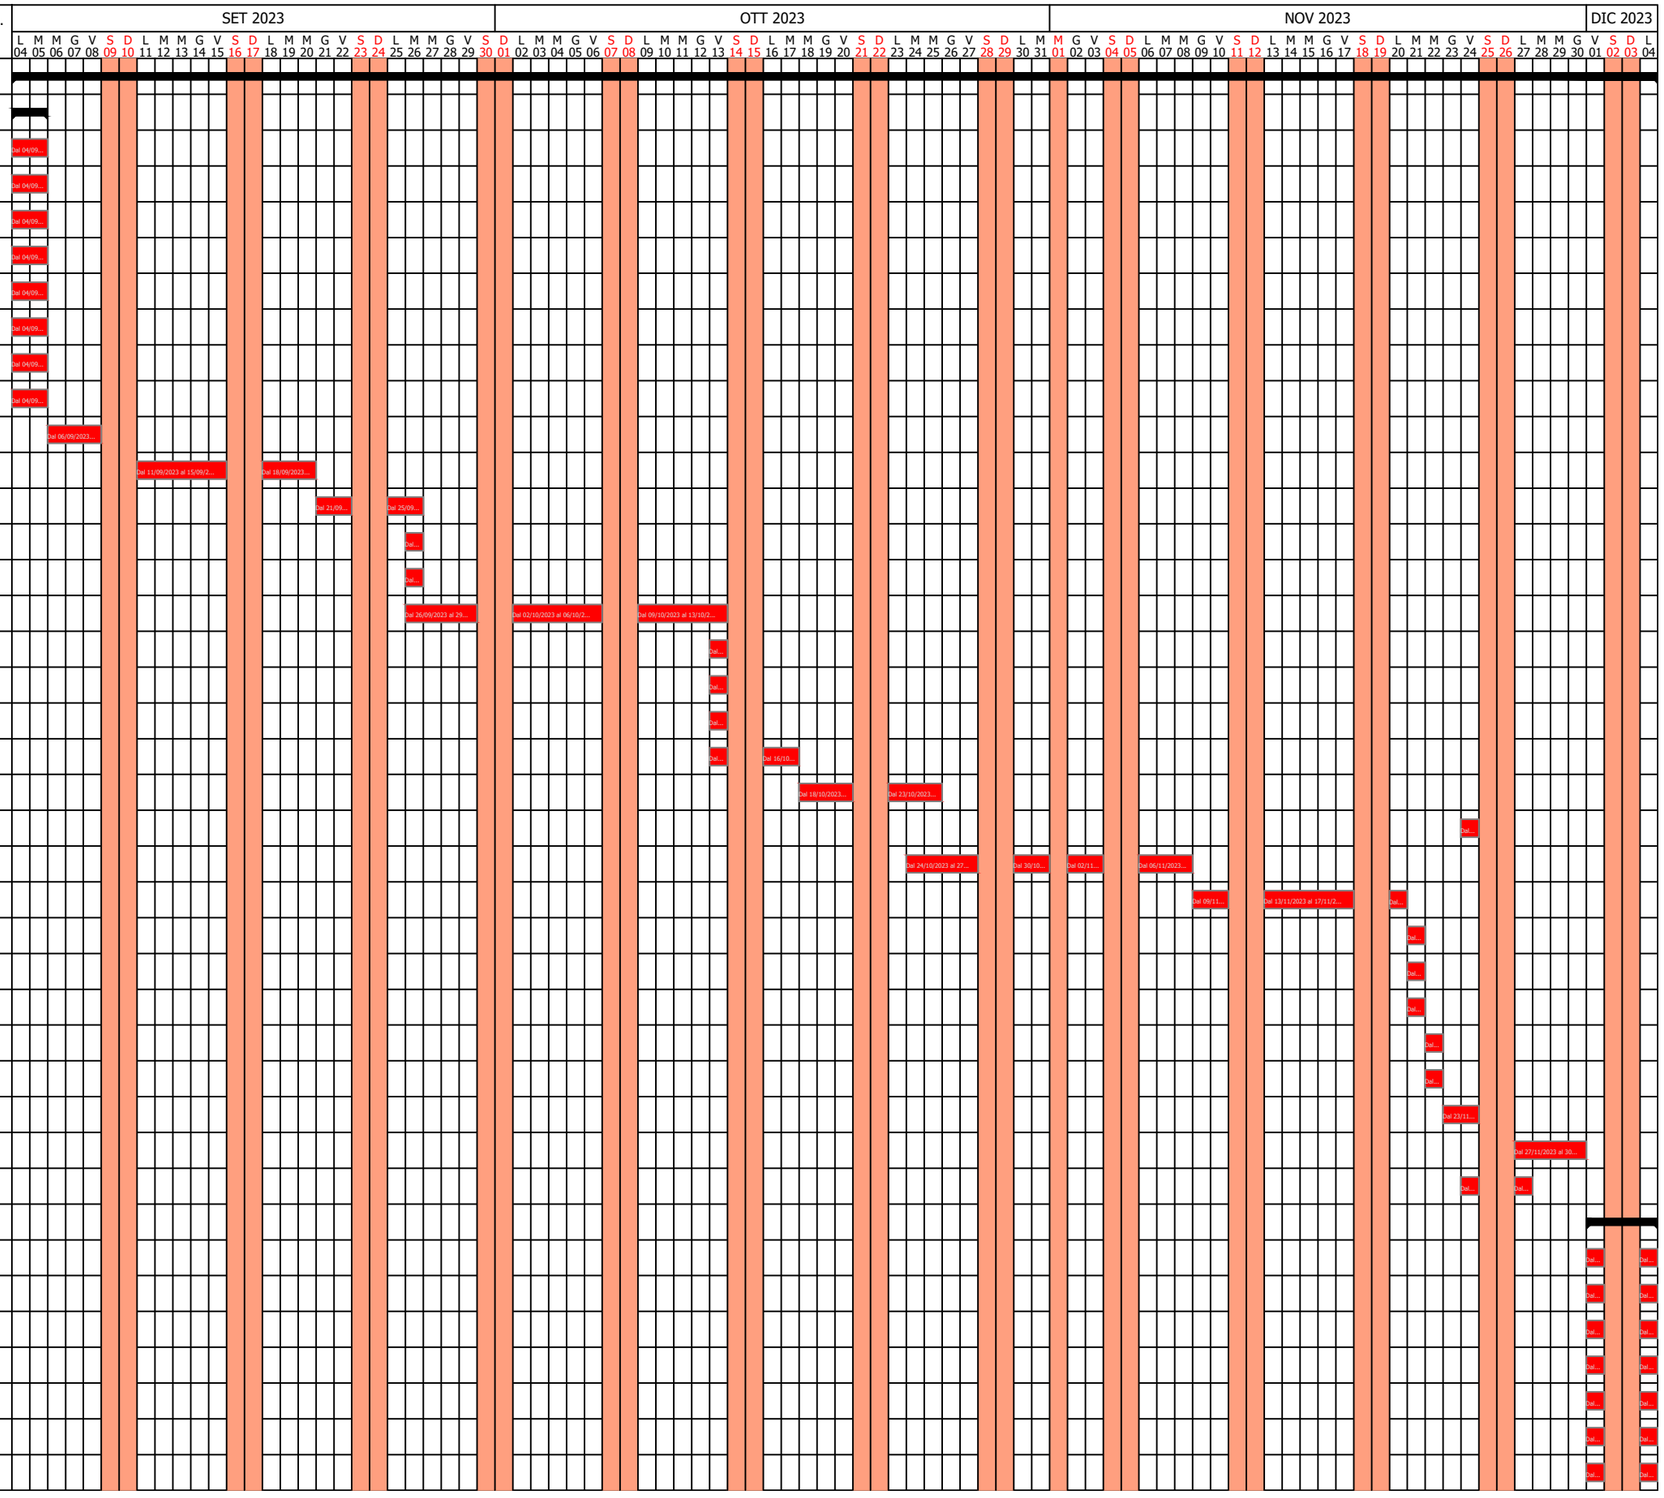
SET 2023
OTT 2023
NOV 2023
DIC 2023
L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D
